


新富洲原ポンプ場No.1,2,3,4,6逆流防止弁設備工事



No.1雨水ポンプ用逆流防止弁(着手前)



No.1雨水ポンプ用逆流防止弁(完成)

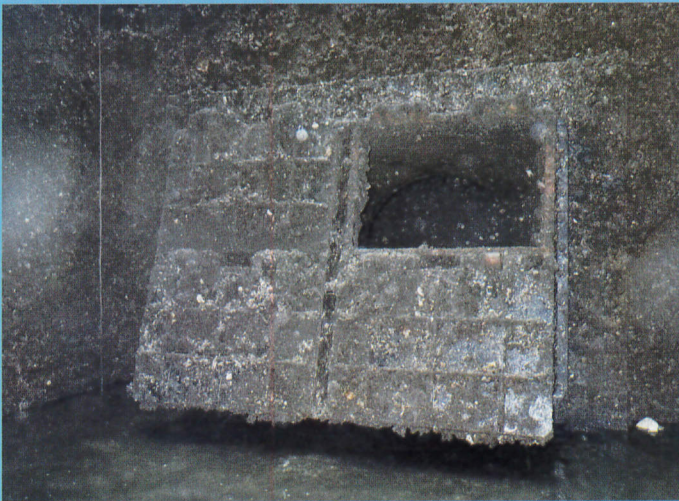

No.4雨水ポンプ用逆流防止弁(着手前)



No.4雨水ポンプ用逆流防止弁(完成)

概 要

工事場所： 四日市市富双二丁目 地内

発注者： 四日市市上下水道局
技術部 施設課

工 期： 着手 平成30年7月 5日
完成 平成31年2月28日

工事概要： 新富洲原ポンプ場に設置してある雨水ポンプ用逆流防止弁の撤去、更新と吐出井角落の制作を行うものである。

主要機器： No.1雨水ポンプ用逆流防止弁 φ1500 ステンレス製：1台
No.2,3,4,6雨水ポンプ用逆流防止弁 2900mmW×2000mmH ステンレス製：1台
鋼製角落し 6.00m×6.50m 三方水密ゴム：1門(4枚)
上記に伴う吐出管内面防食塗装及び既設鋼製角落しの塗装塗り替え工事
水路 足掛金物 400mm×320mm D22：60本



株式会社 上田新工業

◆本 社

〒510-0874 三重県四日市市河原田町1620-1

TEL 059-345-4761 FAX 059-346-8921

